

Comune di Ubiale Clanezzo
Provincia di Bergamo

DIAGRAMMA DI GANTT **Cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI STORICI PEDONALI E DELLA VIABILITA' COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Ubiale Clanezzo

per presa visione

IL COMMITTENTE

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


(Architetto Offredi Marco)

(Responsabile del Procedimento Carminati Matteo)



Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ASFALTI COMUNALI	70 g																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g	Z3																				
Asportazione di strato di usura e collegamento	23 g	Z3																				
Formazione di fondazione stradale	17 g																					
Formazione di manto di usura e collegamento	20 g																					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	8 g																					
Smobilizzo del cantiere	3 g																					
LOCALITA' GRUMELLO	70 g																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	Z1																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1																				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2 g	Z1																				
Asportazione di strato di usura e collegamento	4 g	Z1																				
Rimozione di pavimenti esterni	6 g	Z1																				
Scavo a sezione ristretta	5 g	Z1																				
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	10 g	Z1																				
Posa di speco fognario prefabbricato	10 g	Z1																				
Posa di conduttura telefonica	10 g	Z1																				
Posa di conduttura illuminazione pubblica	10 g	Z1																				
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	2 g																					
Rinterro di scavo	3 g																					
Formazione di massetto per esterni	8 g																					

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Impermeabilizzazione di pavimentazione esterna	2 g																						
Posa di pavimento e alzate in pietra di Luserna	22 g																						
Posa di pali per pubblica illuminazione	6 g																						
Montaggio di apparecchi illuminanti	4 g																						
Smobilizzo del cantiere	3 g																						
LOCALITA' CA' BONORE'	70 g																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	Z2																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z2																					
Rimozione di pavimenti esterni	10 g						Z2																
Scavo a sezione ristretta	7 g											Z2											
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g																Z2						
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	4 g																		Z2				
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.	4 g																		Z2				
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	3 g																						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	7 g																						
Posa di speco fognario prefabbricato	7 g																						
Posa di conduttura telefonica	7 g																						
Posa di conduttura illuminazione pubblica	7 g																						
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	2 g																						
Rinterro di scavo	5 g																						
Formazione di massetto per esterni	15 g																						

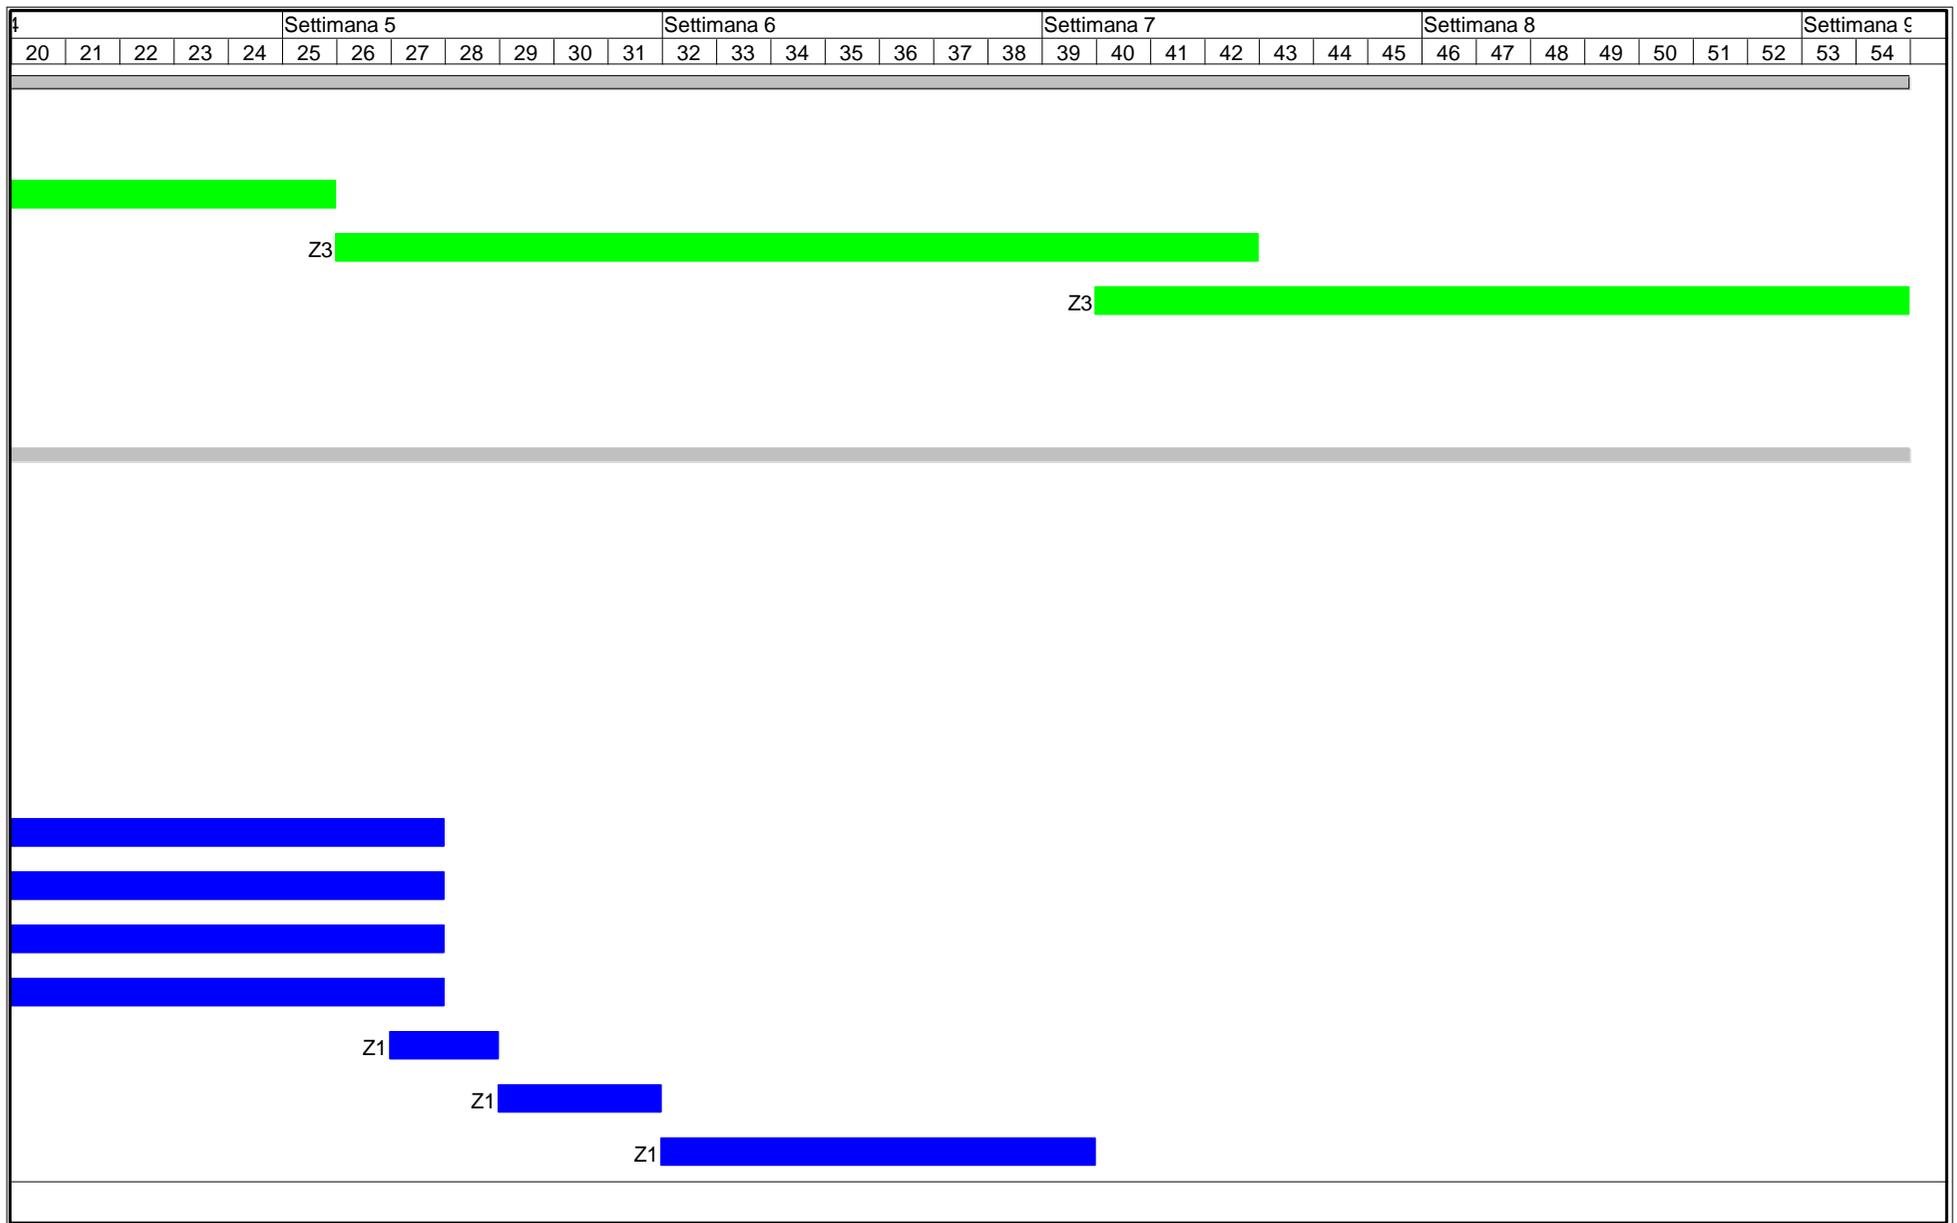

					Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9																																																																																								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54																																																																																							
																																											Z2																																																																														
																																																							Z2																																																																		
																																																																			Z2																																																						

	Settimana 10						Settimana 11						Settimana 12						Settimana 13						Settimana 1											
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89		
					Z3																															
																	Z3																			

9	Settimana 10						Settimana 11						Settimana 12						Settimana 13						Settimana 1									
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	[Redacted]																																	
	[Redacted]																																	
	[Redacted]																																	
						Z2	[Redacted]																											
							Z2	[Redacted]																										
									Z2	[Redacted]																								
